PROJET : *AP1 - Infra-Site*

Groupe : *N°5*

Chef de projet : *Nathan* Ogoreck

Durée prévisionnelle du projet : **13 h 00**

Durée réelle du projet : **16 h 00**

N°	Activité	Etudiant	Planning	Temps
1	Activité 1 : Cadrage, Trello et GANTT	Deniz/Nathan	Prévisionnel	1:30
			Réel	2:00
2	Activité 2 : Schéma réseau, adressage IP et accès	Deniz	Prévisionnel	1:30
			Réel	1:20
3	Activité 3 : Remise à zéro et initialisation (configuration)	Nathan	Prévisionnel	3:00
			Réel	2:10
4	Activité 4 : Administration distante sécurisée (SSH et IT)	Deniz	Prévisionnel	3:00
			Réel	6:00
5	Activité 5 : Montage en baie et câblage du matériel	Deniz/Nathan	Prévisionnel	1:00
			Réel	1:16
6	Activité 6 : Configuration du routage dynamique RIPv2 et de la passerelle de sortie vers le routeur LABO	Deniz	Prévisionnel	3:00
			Réel	4:10
7	Activité 7 : Serveur TFTP et sauvegarde automatique	Nathan	Prévisionnel	3:00
			Réel	3:07
8	Activité 8 : Configuration du NAT/PAT (Accès Internet)	Nathan	Prévisionnel	2:00
			Réel	2:00
9	Activité 9 : Pare-feu : Filtrage des accès depuis l'Extérieur/Internet	Nathan	Prévisionnel	6:00
			Réel	4:00
10	Activité 10 : ACLs : Isolation inter-services du LAN, accès restreint à l'AD et limitation DMZ	Deniz	Prévisionnel	5:00
			Réel	4:30
11	Activité 11 : Tests et documentation finale	Deniz/Nathan	Prévisionnel	4:00
			Réel	4:00

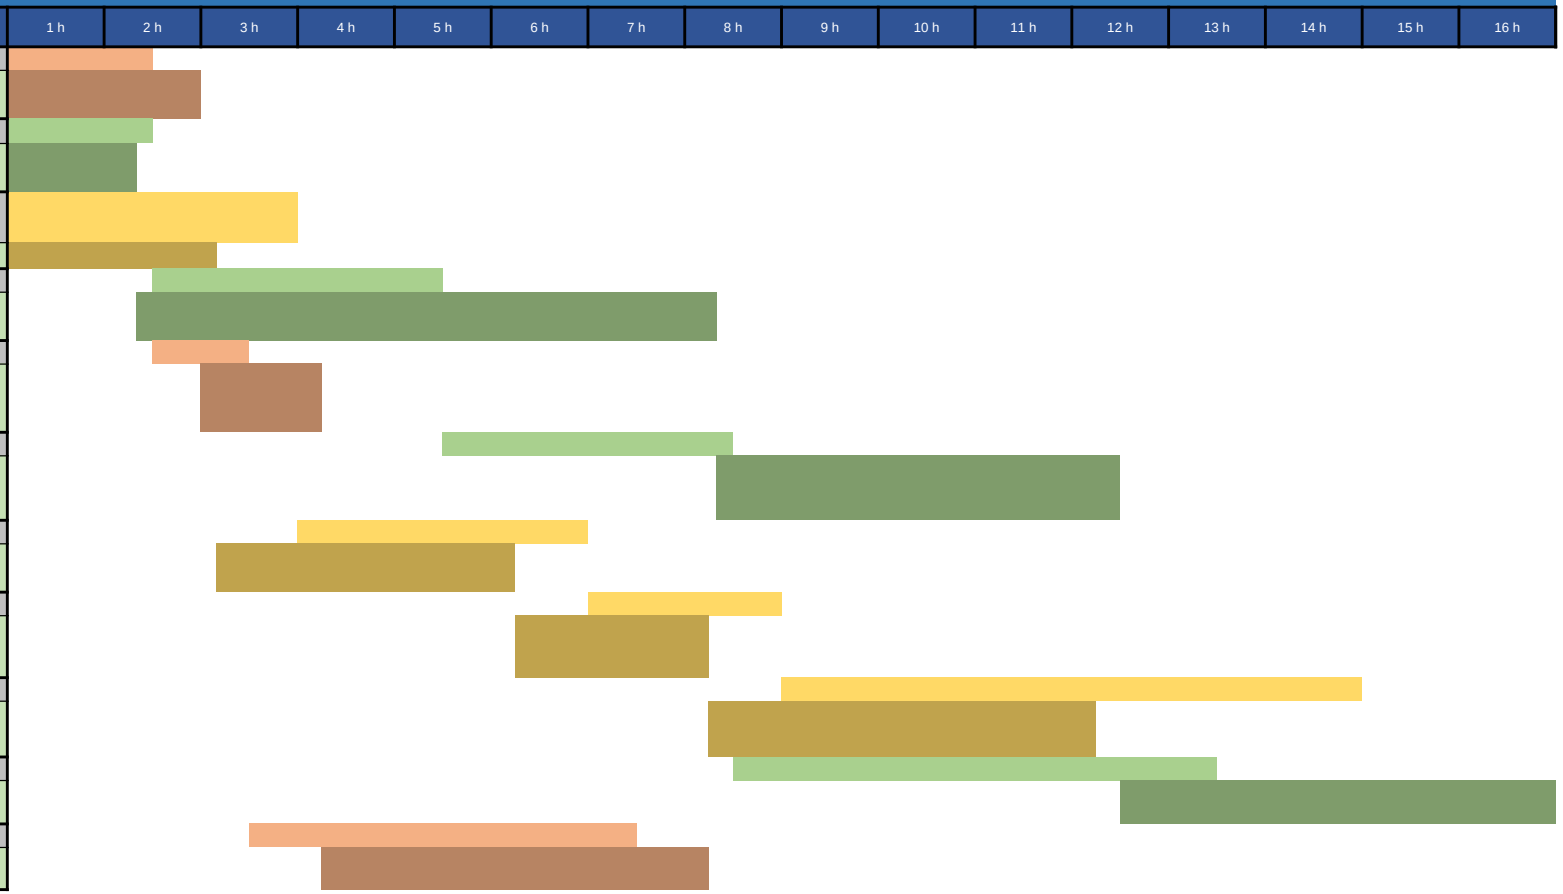

Récapitulatif temps prévu et passé par étudiant		
Etudiant	Temps prévu	Temps réel
Deniz/Nathan	6h30	7h16
Deniz	12h30	16h00
Nathan	13h00	11h17
